



FERMETURE PASSERELLE LECLERC DU 06 AU 20 JUIN 2016 POUR LE MONTAGE DE LA BASE VIE DE CHANTIER

DÉVIATION PENDANT LA FERMETURE :

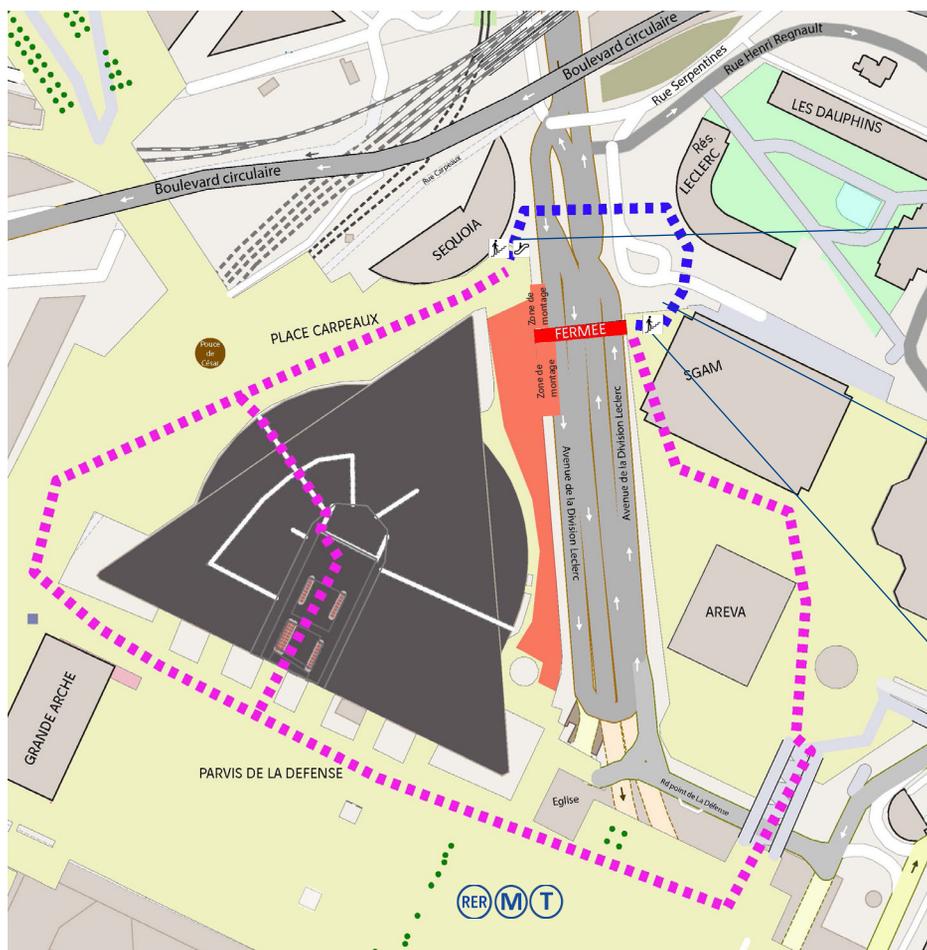



- - - - = cheminement
- - - - = variante cheminement (sans escalier)

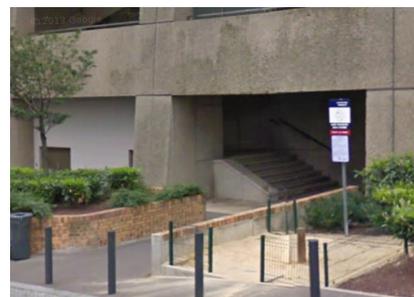

QUOI DE NEUF ?

Pendant le mois de mai, nous avons continué les travaux de fondations débutés au mois de février.

Côté CNIT, nous avons réalisé des pieux qui, dans quelques mois, soutiendront l'ouvrage complet. Ces pieux doivent être ancrés profondément dans le sol car ce sont eux qui vont devoir supporter la structure. Pour cela, nous devons creuser dans des matières de sols variées : remblais, marnes et caillasses, calcaire...

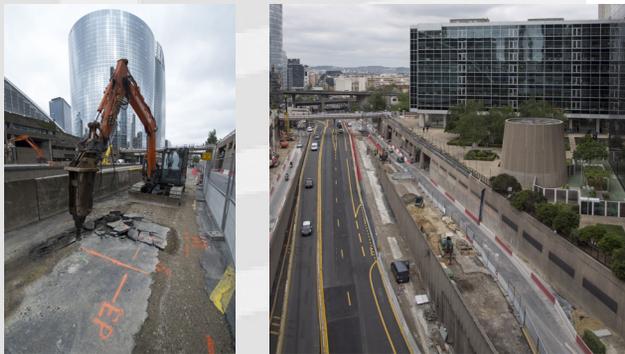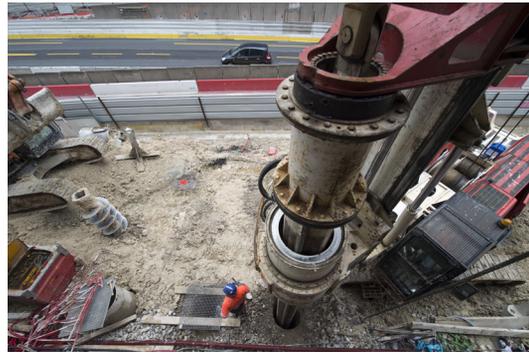

Côté Coupole, l'emprise du chantier a été modifiée et déplacée sur l'ouest de la contre-allée.

Nous y avons réalisé des pieux et des micropieux dans le sol avant de faire du remblaiement.

Au Nord, sur la liaison SEQUOIA, ce sont les Corps d'Etat Techniques du futur ascenseur qui sont entrés en action.

Depuis quelques jours, le pylône du futur ascenseur a été posé à l'intérieur de l'ouvrage béton.

Des façades vitrées viendront compléter cette structure métallique donnant un aspect plus qualitatif à cet ascenseur.


Des travaux « invisibles » ont également été menés : création de l'arrivée pour l'alimentation électrique, création des zones d'évacuation des eaux de pluies...



Enfin, sur cette même liaison, le coulage de la dalle béton qui rejoindra le côté Coupole a commencé.



LES ÉTAPES DE MONTAGE DE LA BASE VIE

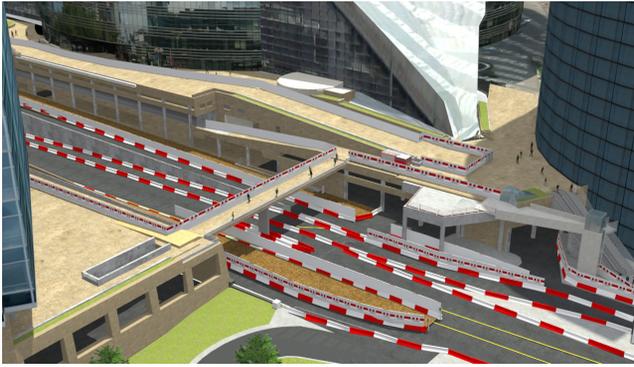

Étape 1 :

Pose de la charpente métallique.
Il s'agit d'un ensemble de 155 pièces fixées les unes aux autres.
Pour le levage, une grue mobile va être utilisée afin de livrer les matériaux de charpente en 3 fois.



Étape 2 :

Pose des bungalows de chantier.
Lors de cette phase, 2 grues mobiles d'une capacité de 130 Tonnes (compte tenu de l'excentrement du levage) vont être utilisées permettant de lever l'ensemble des bungalows.



Les éléments survoleront la passerelle lors du montage de la base vie. Pour des raisons évidentes de sécurité, la passerelle restera fermée pendant toute la période du montage.

LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN

Travaux côté Coupole :

- début des travaux de paroi berlinoise
- terrassements
- micropieux



Travaux côté CNIT :

- modification de l'emprise,
- fin des enrobés,
- montage grue « G1 »

Travaux ascenseur « Sequoia » :

Corps d'Etats Techniques :

- Pose de la pierre
- Pose des vitrages

Travaux parvis CNIT :

Montage de la base vie

Des questions ? Des remarques ?



N° vert :
08 00 00 03 43



Adresse mail :
trinity.riverain@vinci-construction.fr



QUELS IMPACTS POUR VOUS ?

Nous mettons tout en œuvre pour que notre organisation de chantier ait le moins d'impact possible sur les circulations automobiles et piétonnes.

Toutefois, nos travaux de fondation nécessitent des interventions de nuit conduisant à la fermeture ou la restriction de certaines voies.

- Impacts sur les voiries* :

JUIN 2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
Contre-allée CNIT																														
Contre-allée Coupole																														
RN192 (vers La Défense)																														
Bretelle accès A14 (vers Paris)																														
Passerelle Leclerc																														

■ = fermeture de nuit
(de 22h à 5h)

■ = Restriction à 1 voie


■ = Fermeture de jour et de nuit



Entre le 17 et le 20 juin, 130 bungalows vont être posés sur la charpente à l'aide de grues mobiles. Cet événement exceptionnel nécessite des moyens exceptionnels tels que la fermeture des voies.

Le parking CNIT restera cependant ouvert.

- Impacts sur les cheminements** :

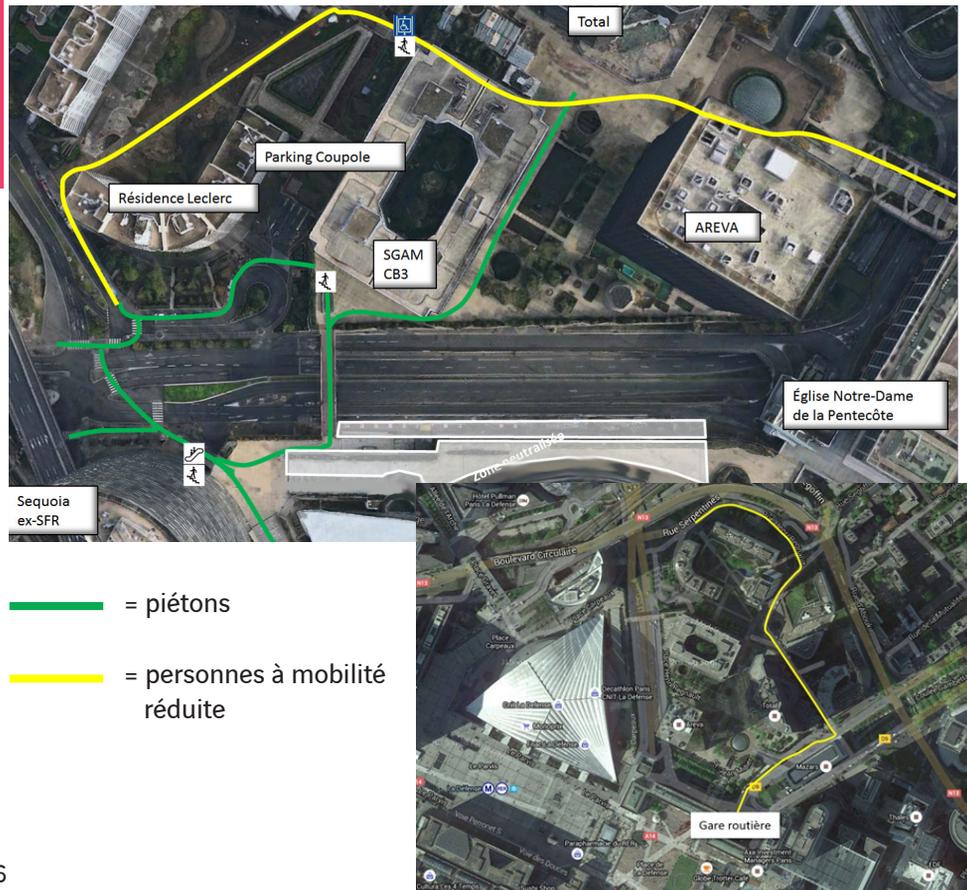

— = piétons

— = personnes à mobilité réduite

Directeur de la publication :

VINCI Construction France : Dominique HELSON

Rédaction // Mise en page :

VINCI Construction France : Pauline VIGNE

Comité de rédaction :

Les équipes TRINITY

Crédit photos :

© L.ZYLBERTMAN/Graphix-Images

* Les dates citées sont sous réserve des aléas techniques et climatiques du chantier

** Hors période de travaux du 06/06/2016 au 20/06/2016



ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT
DE LA DÉFENSE SEINE ARCHE
OPÉRATION D'INTÉRÊT NATIONAL

Un programme réalisé dans le cadre
de l'Opération d'Intérêt National
de La Défense Seine Arche

www.epadesa.fr
